

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C
**"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili".**

ADEGUAMENTO PFTE
**"REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI
DEPURAZIONE LOCALITÀ PERITO"**

PFTE

ELABORATO	Cronoprogramma dei lavori	SCALA
D-R-140-05		

RUP Ing. Giovanna Ferro	Progettista Ing. Costabile Di Matteo Studio di Ingegneria e Architettura Via Margherita n. 15 Castellabate (SA) - 84048 Tel: 3336398427 e-mail: costabiledimatteo@hotmail.com Pec: costabile.dimatteo@ordingsa.it
-----------------------------------	--



Presidente del CdA
Avv. Gennaro Maione


Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

DATA
03/2025
Revisione 3

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili". ADEGUAMENTO PFTE. "REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITA' PERITO (SA)

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
	A	REALIZZAZIONE NUOVO COMPARTO ESSICCAZIONE FANGHI	115
1	a.1	Allestimento cantiere	5
2	a.2	Scavi	10
3	a.3	Realizzazione platea e pavimentazione superficiale	15
4	a.4	Realizzazione vasca raccolta fanghi diskdratati	15
5	a.5	Realizzazione reti area essiccazione	15
6	a.6	Montaggio tettoia di copertura	25
7	a.7	Posa in opera di biodryer e apparecchiature a corredo	20
8	a.8	Posa in opera di bunker	10
	B	SISTEMAZIONI E RETI ESTERNE	43
9	b.1	Posa in opera di coclee complete di strutture di sostegno	13
10	b.2	Realizzazione sezione trattamento aria	10
11	b.3	Completamento reti esterne (metano,aria compressa,acque serv.)	10
12	b.4	Ripristini	10
	C	REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE	15
13	c.1	Installazione nuovi quadri elettrici e collegamenti alle utenze	15
	D	COLLAUDO FUNZIONALE	7
14	d.1	Collaudo funzionale	7
	E	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1	47
15	e.1	Predisposizione cantiere	1
16	e.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
17	e.3	Realizzazione opere civili in ca	15
18	e.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
19	e.5	Completamento carpenteria metallica	5
20	e.6	Posa piping	6
21	e.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
22	e.8	Collaudo	1
23	e.9	Sistemazione esterna e viabilità	3
	F	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1	47
24	f.1	Predisposizione cantiere	1
25	f.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
26	f.3	Realizzazione opere civili in ca	15
27	f.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
28	f.5	Completamento carpenteria metallica	5
29	f.6	Posa piping	6
30	f.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
31	f.8	Collaudo	1
32	f.9	Sistemazione esterna e viabilità	3
	G	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	47
33	g.1	Predisposizione cantiere	1
34	g.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
35	g.3	Realizzazione opere civili in ca	15
36	g.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
37	g.5	Completamento carpenteria metallica	5
38	g.6	Posa piping	6
39	g.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
40	g.8	Collaudo	1
41	g.9	Sistemazione esterna e viabilità	3
	H	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	47
42	h.1	Predisposizione cantiere	1
43	h.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
44	h.3	Realizzazione opere civili in ca	15
45	h.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
46	h.5	Completamento carpenteria metallica	5
47	h.6	Posa piping	6
48	h.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
49	h.8	Collaudo	1
50	h.9	Sistemazione esterna e viabilità	3
	I	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	47
51	i.1	Predisposizione cantiere	1
52	i.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
53	i.3	Realizzazione opere civili in ca	15
54	i.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
55	i.5	Completamento carpenteria metallica	5
56	i.6	Posa piping	6
57	i.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
58	i.8	Collaudo	1
59	i.9	Sistemazione esterna e viabilità	3
	L	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	47
60	l.1	Predisposizione cantiere	1
61	l.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
62	l.3	Realizzazione opere civili in ca	15
63	l.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
64	l.5	Completamento carpenteria metallica	5
65	l.6	Posa piping	6
66	l.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
67	l.8	Collaudo	1
68	l.9	Sistemazione esterna e viabilità	3
	M	UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2	47
69	m.1	Predisposizione cantiere	1
70	m.2	Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento	4
71	m.3	Realizzazione opere civili in ca	15
72	m.4	Installazione opere elettromeccaniche	10
73	m.5	Completamento carpenteria metallica	5
74	m.6	Posa piping	6
75	m.7	Installazione quadri e impianti elettrici	2
76	m.8	Collaudo	1
76	m.9	Sistemazione esterna e viabilità	3

CRONOPROGRAMMA

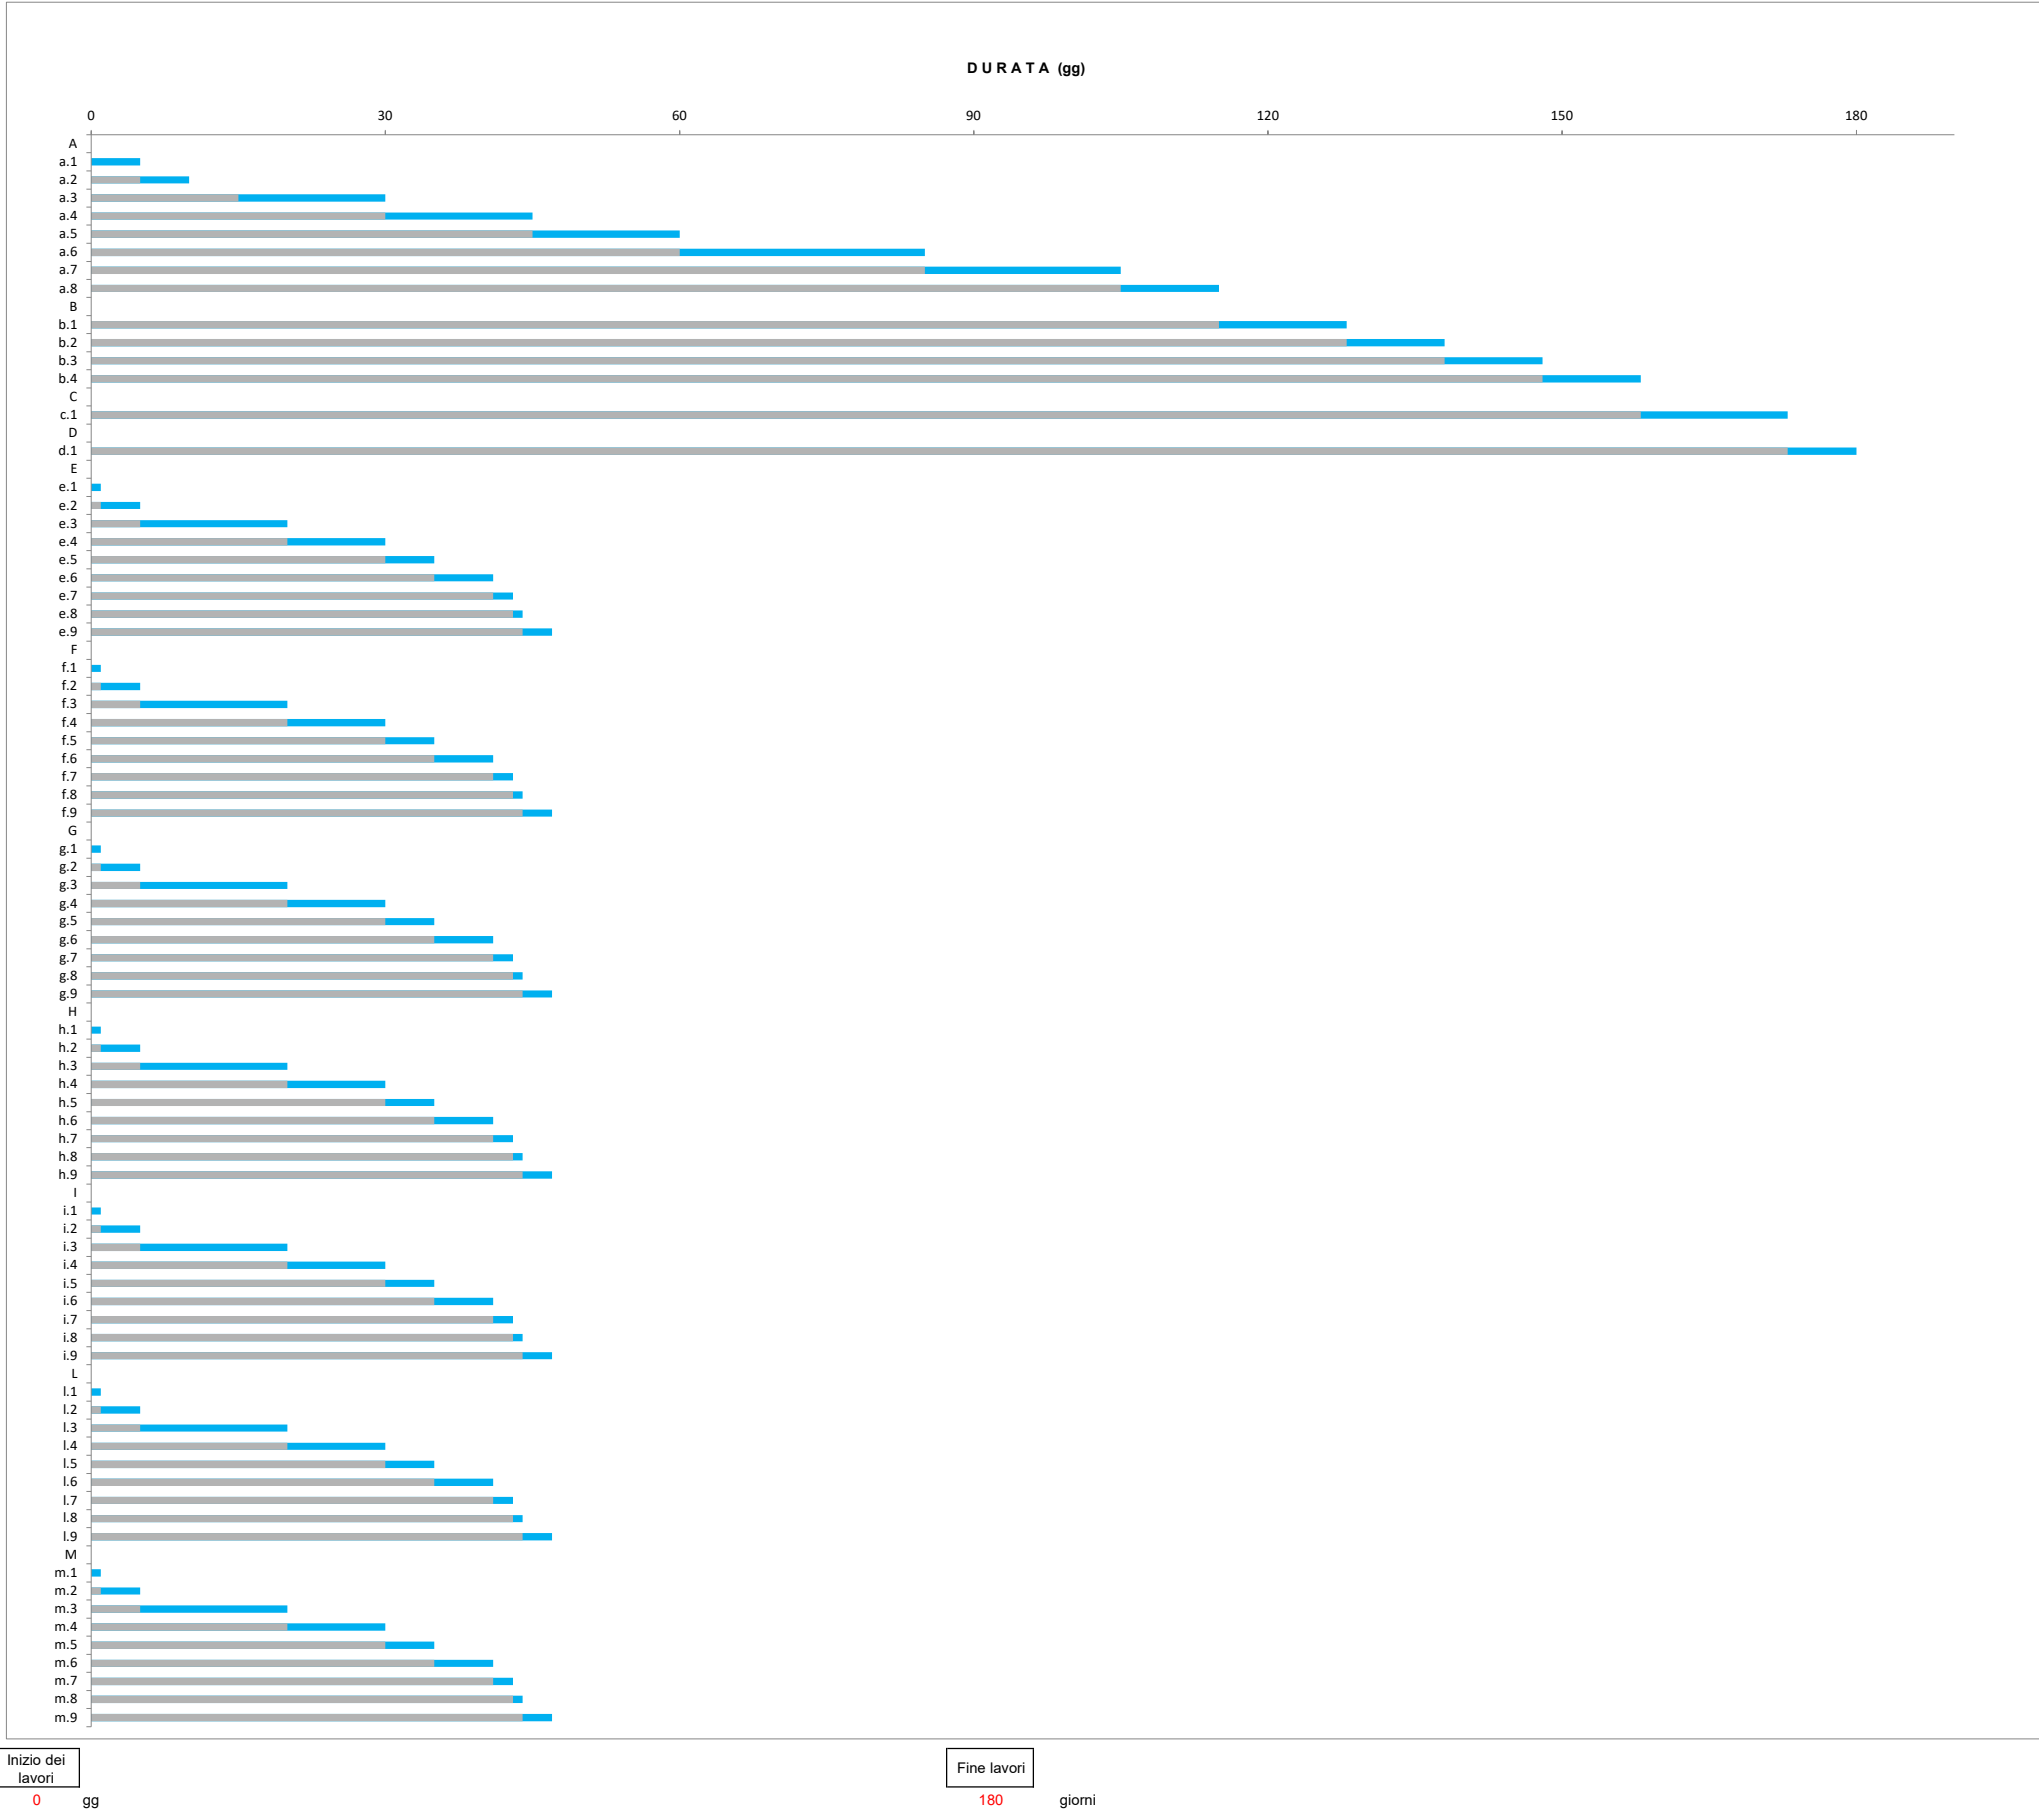

Durata dei lavori

180 giorni naturali e consecutivi
