

PR Campania FESR 2021/2027.

D.G.R. n. 464 del 06/09/2022 "Misure di razionalizzazione della spesa.
Programmazione interventi nei settori idrico e fognario regionali Asse VI - O.S. 6.3
Azione 6.3.1 POR FESR 2014/2020"

**"Interventi di revisione della rete fognaria delle zone pianeggianti del
territorio comunale di Teggiano" - CUP: F81D19000090006**



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Progettazione:

E DI LING s.c.a.r.l.
— SOCIETÀ DI INGEGNERIA —

Direttore Generale:

ing. Maurizio DESIDERIO

Il Responsabile del Progetto:

ing. Giovanna FERRO

Geologia:

geol. Lucio GNAZZO

Presidente C.D.A.:

avv. Gennaro MAIONE

OGGETTO:

Cronoprogramma delle lavorazioni

SCALA:

-

TAVOLA:

EC.07

O	Febbraio 2026	emissione per approvazione	RS	DL	GL
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DEI LAVORI


PR Campania FESR 2021/2027
D.G.R. n. 464 del 06/09/2022 "Misure di razionalizzazione della spesa.
Programmazione interventi nei settori idrico e fognario regionali Asse VI - O.S. 6.3
Azione 6.3.1 POR FESR 2014/2020"

"Interventi di revisione della rete fognaria delle zone pianeggianti del
territorio comunale di Teggiano" - CUP: F81D19000090006

N. fase	Attività	Inizio	Fine	Durata singola fase gg.
---------	----------	--------	------	-------------------------


1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15/02/2026	16/04/2026	60
2	Procedura di affidamento appalto integrato	17/04/2026	16/07/2026	90
3	Stipula contratto	16/07/2026	15/08/2026	30
4	Progettazione esecutiva	16/08/2026	15/10/2026	60
5	Consegna lavori	15/10/2026	30/10/2026	15
6	Accantieramento	15/10/2026	14/11/2026	30
7	Realizzazione Sollevamento Fiego ed opere annesse	04/11/2026	04/03/2027	120
8	Realizzazione tratto Q1 - Via Prato IV	04/03/2027	18/04/2027	45
9	Realizzazione Sollevamento Impallizzata alla loc. Codaglioni ed opere annesse	13/01/2027	13/04/2027	90
10	Realizzazione tratto D2 - via Codaglioni	13/04/2027	12/07/2027	90
11	Realizzazione tratto D2 nord - Codaglioni Nord Zona Industriale	12/07/2027	01/08/2027	20
12	Realizzazione tratto D2 est - via Impalizzata	01/08/2027	21/08/2027	20
13	Realizzazione tratto Tratto D3 - SP 11	27/06/2027	11/08/2027	45
14	Realizzazione Tratto E - Via Terramagna	01/08/2027	30/09/2027	60
15	Realizzazione tratto G - Via Vallone dei Cani	20/09/2027	20/10/2027	30
16	Realizzazione tratto T - Via Cannicelle	10/10/2027	24/11/2027	45
17	Realizzazione tratto tratto T1 - Via Cannicelle	09/11/2027	19/12/2027	40
18	Opere di finitura e completamento	19/11/2027	19/12/2027	30
19	Smobilizzo del cantiere e CONCLUSIONE LAVORI	19/12/2027	08/01/2028	20
20	Collaudo tecnico amministrativo (collaudo provvisorio)	29/12/2027	26/06/2028	180

D U R A T A (gg)

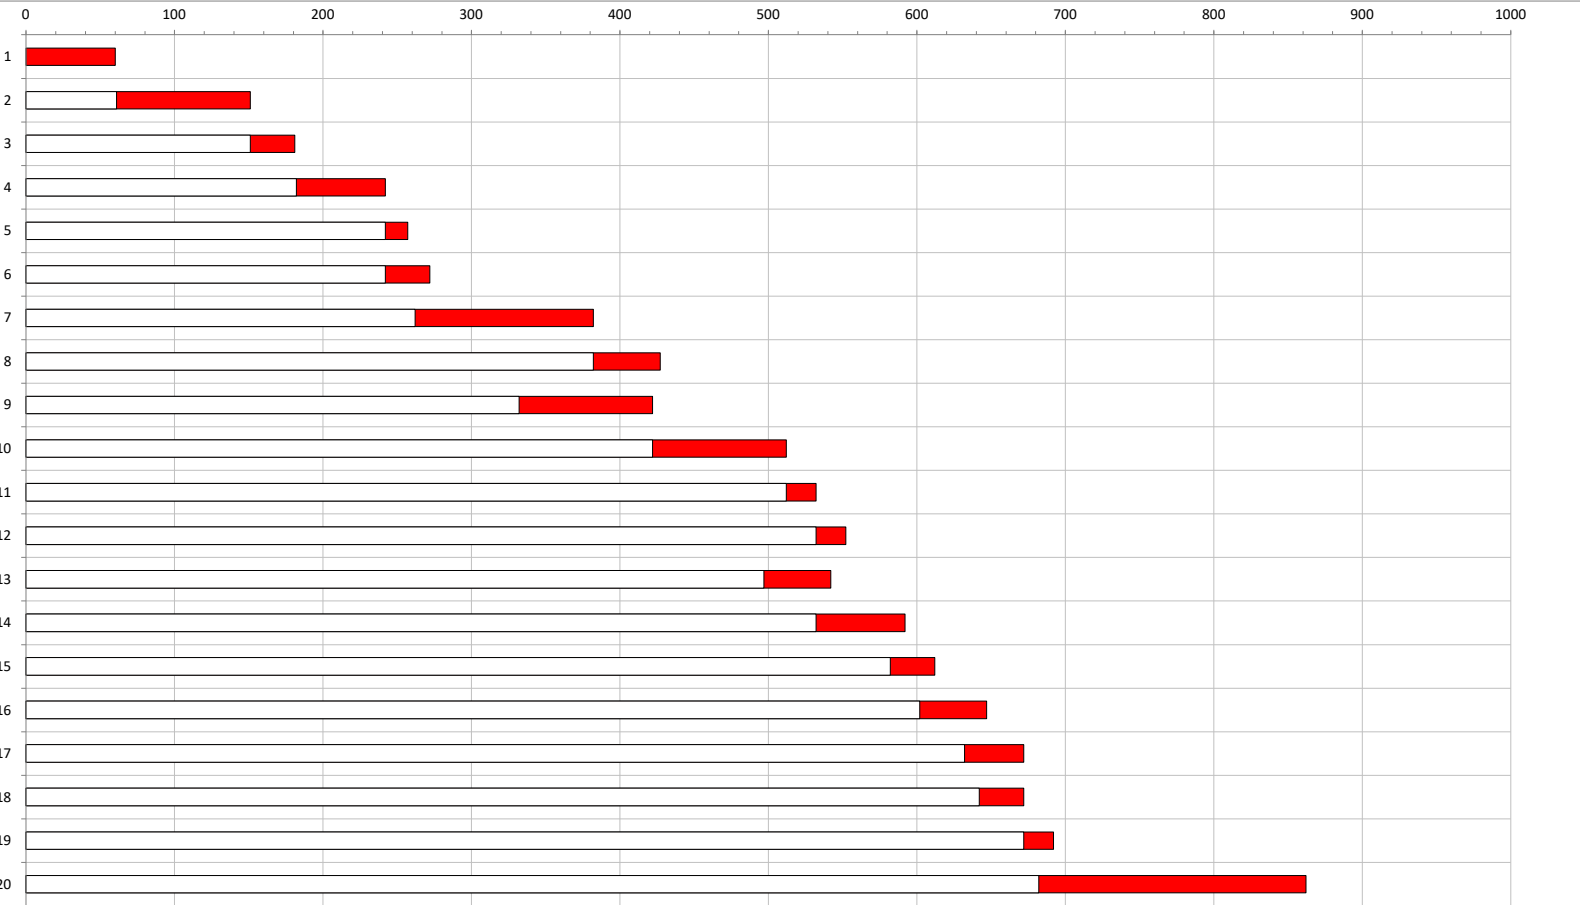

Produttività di cantiere

Giorni di durata del cantiere	0,0	45	90	135	180	225	270	315	360
AVANZAMENTO PARZIALE DEL CANTIERE SU BASE MENSE (IMPORTO NETTO LAVORI)	€ -	€ 120.331,79	€ 601.658,93	€ 1.082.986,07	€ 1.323.649,65	€ 1.564.313,22	€ 1.804.976,79	€ 2.045.640,36	€ 2.406.635,72
AVANZAMENTO PROGRESSIVO DEL CANTIERE IN PERCENTUALE ALL'IMPORTO OFFERTO SU BASE MENSILE	0%	5%	25%	45%	55%	65%	75%	85%	100%

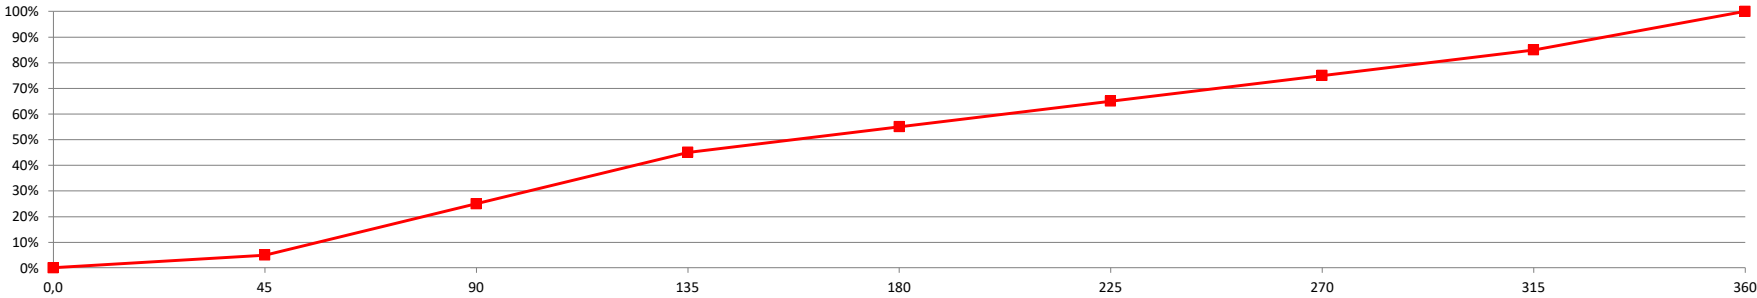

Tempo esecuzione lavori previsto (gg naturali e consecutivi)

450 giorni

Importo lordo lavori

€ 2.406.635,72
